Terminplan

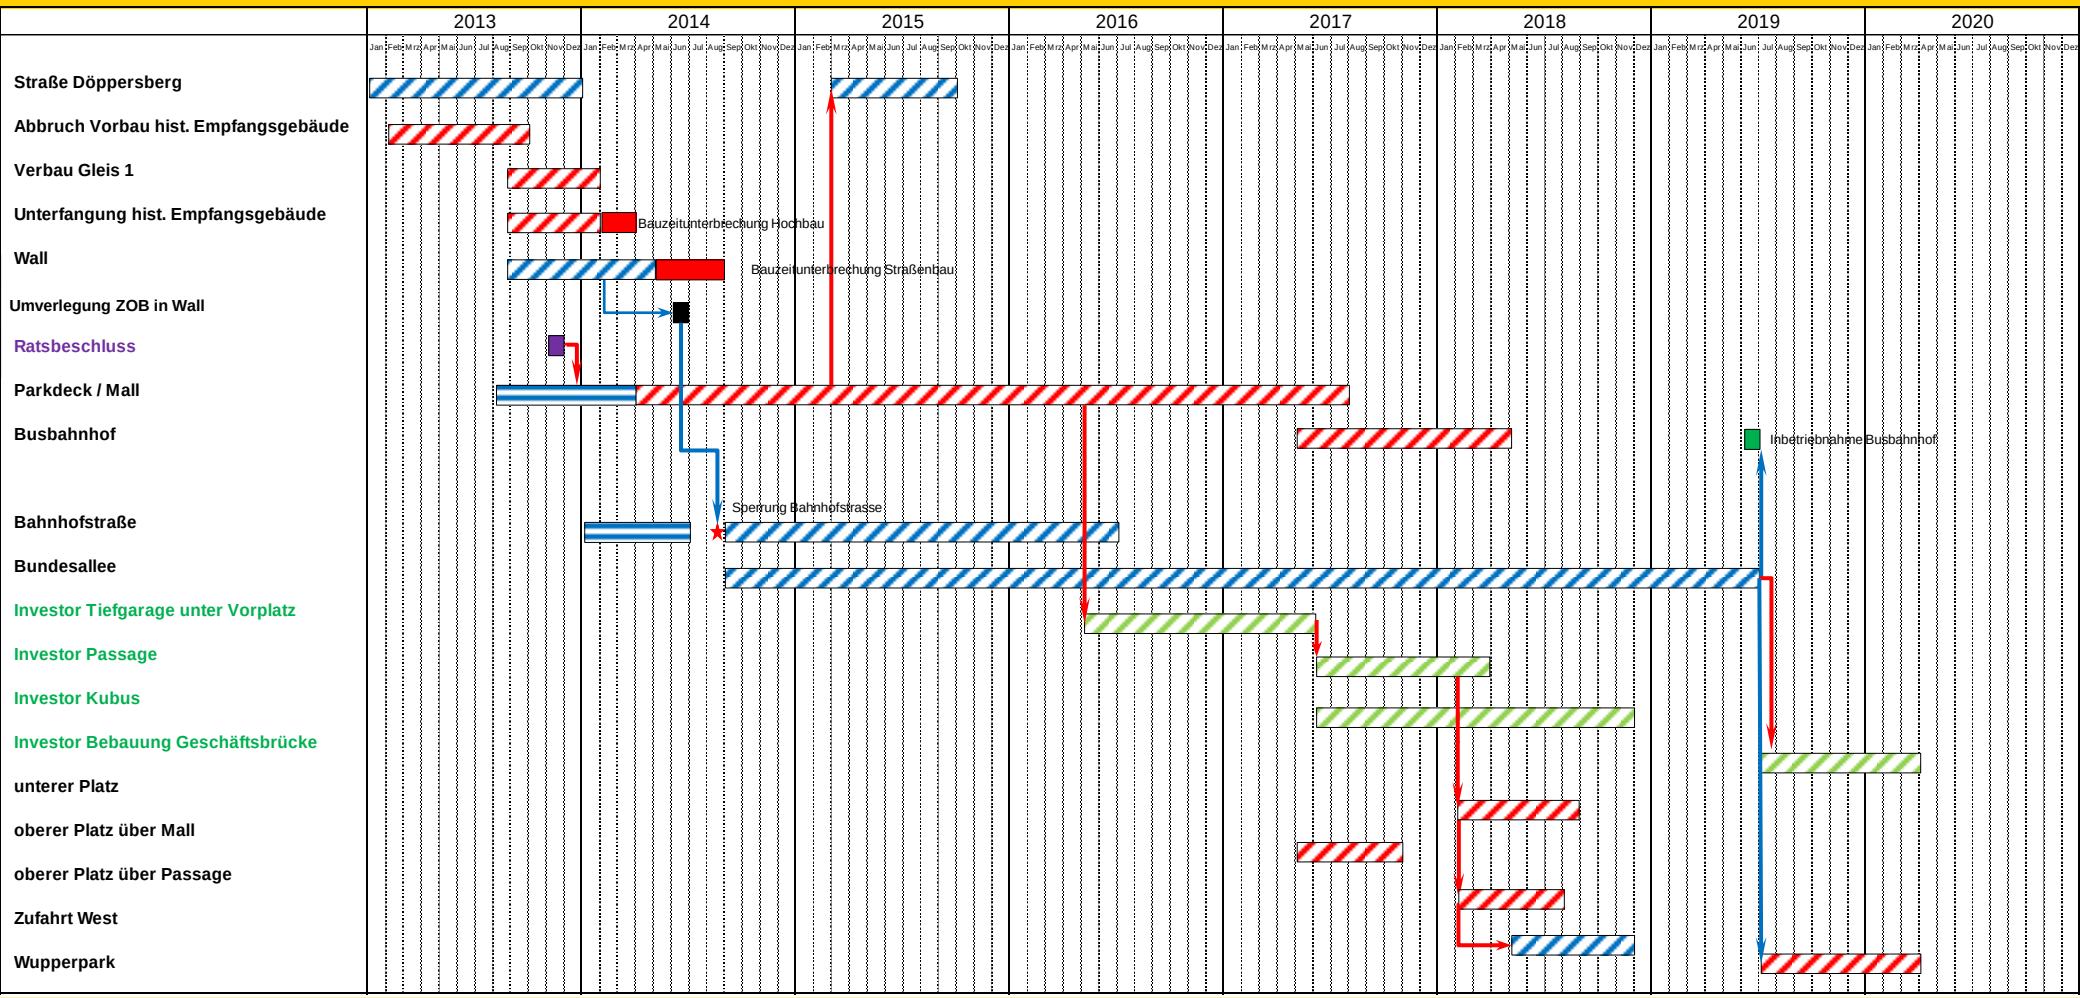
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Straße Döppersberg
Abbruch Vorbau hist. Empfangsgebäude
Verbau Gleis 1
Unterfangung hist. Empfangsgebäude
Bauzeitunterbrechung Hochbau
Wall
Bauzeitunterbrechung Straßenbau
Umverlegung ZOB in Wall
Ratsbeschluss
Parkdeck / Mall
Busbahnhof
Inbetriebnahme Busbahnhof
Sperrung Bahnhofstrasse
Bahnhofstraße
Bundesallee
Investor Tiefgarage unter Vorplatz
Investor Passage
Investor Kubus
Investor Bebauung Geschäftsbrücke
unterer Platz
oberer Platz über Mall
oberer Platz über Passage
Zufahrt West
Wupperpark
